



Scoping e Estimativas Técnicas: **do palpite a faixa com buffer**

Autor: PDI Marcos Luciano - marcosluciano.rodrigues@v4company.com

Unidade: FV Marketing / V4 Company, Automação e Infraestrutura

Módulo: 07 - Gestão de Projetos Técnicos, Atividade 1

Data: Setembro 2026

Status: **NÃO PUBLICADO** - Desenvolvido / Homologação pendente

Versão: 1.0

pdi-gestao-projetos-tecnicos-a1

1. Contexto

A área de **Automação e Infraestrutura da FV Marketing** entrega automações, integrações e relatórios dos quais a operação depende para campanhas e decisões semanais. Os compromissos de prazo saíam como número único ("uns 3 dias"), sem escopo escrito e sem buffer.

O resultado era estouro recorrente, retrabalho de última hora e perda de credibilidade: a operação parou de confiar nos prazos e passou a planejar com margem própria, o que atrasa campanhas e desloca verba.

2. Diagnóstico

Amostra de 6 entregas (ago/2026): **desvio médio de 60%** entre estimado e real, e só 30% tinham escopo escrito. Causas identificadas: pacotes grandes demais, estimativa sem consultar o executor, buffer cortado por pressão e escopo mudando sem reestimativa.


- Número único comunica certeza que não existe.
- Pacote grande esconde risco e impede detecção precoce.
- Sem histórico de real vs estimado, cada estimativa recomeça do zero.

3. Solução

Método repetível em 5 passos: **checklist de scoping** (Definition of Ready), **decomposição** em pacotes de até 1 dia, **estimativa de 3 pontos** com PERT $E = (0 + 4M + P) / 6$, **buffer visível de 20%** e **faixa do cone da incerteza** revisada em 3 marcos.

- STANDARD-SCOPING-ESTIMATIVAS.md: regras, PERT, cone e anti-padroes.
- planilha-estimativa.md: template + exemplo real do relatório semanal (6 pacotes, 17h + 3,4h de buffer, 4 dias úteis).
- checklist-scoping.md: Definition of Ready pré-estimativa.

4. Como funciona

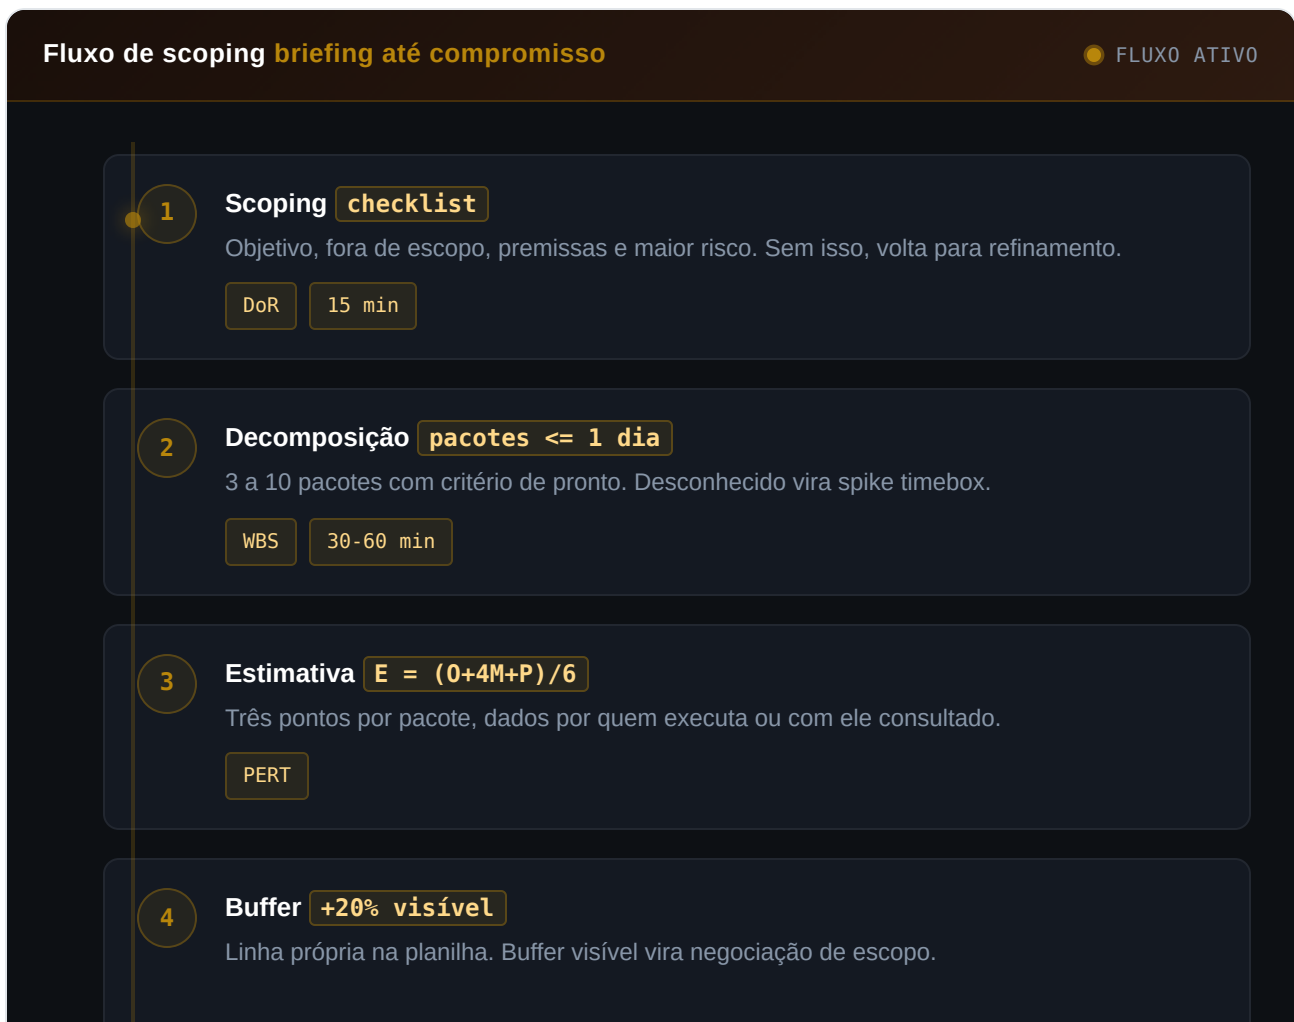

buffer

5

Compromisso

faixa do cone

Conceito 0,25x-4x, requisitos 0,5x-2x, design 0,8x-1,25x. Reestima em 3 marcos.

faixa

3 marcos

Exemplo: relatório semanal, 6 pacotes, 17h + 3,4h = 4 dias úteis (faixa 2 a 7) próximas 4 entregas usam o método

5. Entregas

ARQUIVO	CONTEÚDO
STANDARD-SCOPING-ESTIMATIVAS.md	Regras de decomposição, PERT, buffer, cone e anti-padroes
planilha-estimativa.md	Template reutilizável + exemplo real preenchido
checklist-scoping.md	Definition of Ready pré-estimativa
DECK-PDI.md	Narrativa de 13 slides
DEMO-SCRIPT.md	Roteiro de demonstração de 10 min
ROTEIRO-DOMINIO.md	5 perguntas e respostas de domínio

6. Métricas de sucesso

MÉTRICA	ATUAL	META
Desvio médio estimado vs real	60% (6 entregas, ago/2026)	25% (meta)
Entregas com escopo escrito	30%	100% (meta)
Reestimativas por projeto	0	3 por projeto (meta)

Status: Atividade desenvolvida e homologação pendente. Metas são projetadas e serão medidas nas próximas 4 entregas com o método aplicado. Referências: curso Agile Project Management no Coursera, vídeo de estimativas Mountain Goat Software no YouTube, Manifesto Ágil e ensaio The New Methodology de Martin Fowler.
