



PDI 2026: GESTAO DE PROJETOS TECNICOS

# Scoping e Estimativas Tecnicas: do palpite a faixa com buffer

Autor: PDI Marcos Luciano - marcosluciano.rodrigues@v4company.com

Unidade: FV Marketing / V4 Company, Automacao e Infraestrutura

Modulo: 07 - Gestao de Projetos Tecnicos, Atividade 1

Data: Setembro 2026

Status: **NAO PUBLICADO** - Desenvolvido / Homologacao pendente

Versao: 1.0

pdi-gestao-projetos-tecnicos-a1

## 1. Contexto

A area de **Automacao e Infraestrutura da FV Marketing** entrega automacoes, integracoes e relatorios dos quais a operacao depende para campanhas e decisoes semanais. Os compromissos de prazo saiam como numero unico ("uns 3 dias"), sem escopo escrito e sem buffer.

O resultado era estouro recorrente, retrabalho de ultima hora e perda de credibilidade: a operacao parou de confiar nos prazos e passou a planejar com margem propria, o que atrasa campanhas e desloca verba.

## 2. Diagnostico

Amostra de 6 entregas (ago/2026): **desvio medio de 60%** entre estimado e real, e so 30% tinham escopo escrito. Causas identificadas: pacotes grandes demais, estimativa sem consultar o executor, buffer cortado por pressao e escopo mudando sem reestimativa.


- Numero unico comunica certeza que nao existe.
- Pacote grande esconde risco e impede deteccao precoce.
- Sem historico de real vs estimado, cada estimativa recomeca do zero.

### 3. Solucao

Metodo repetivel em 5 passos: **checklist de scoping** (Definition of Ready), **decomposicao** em pacotes de ate 1 dia, **estimativa de 3 pontos** com PERT  $E = (0 + 4M + P) / 6$ , **buffer visivel de 20%** e **faixa do cone da incerteza** revisada em 3 marcos.

- STANDARD-SCOPING-ESTIMATIVAS.md: regras, PERT, cone e anti-padroes.
- planilha-estimativa.md: template + exemplo real do relatorio semanal (6 pacotes, 17h + 3,4h de buffer, 4 dias uteis).
- checklist-scoping.md: Definition of Ready pre estimativa.

### 4. Como funciona

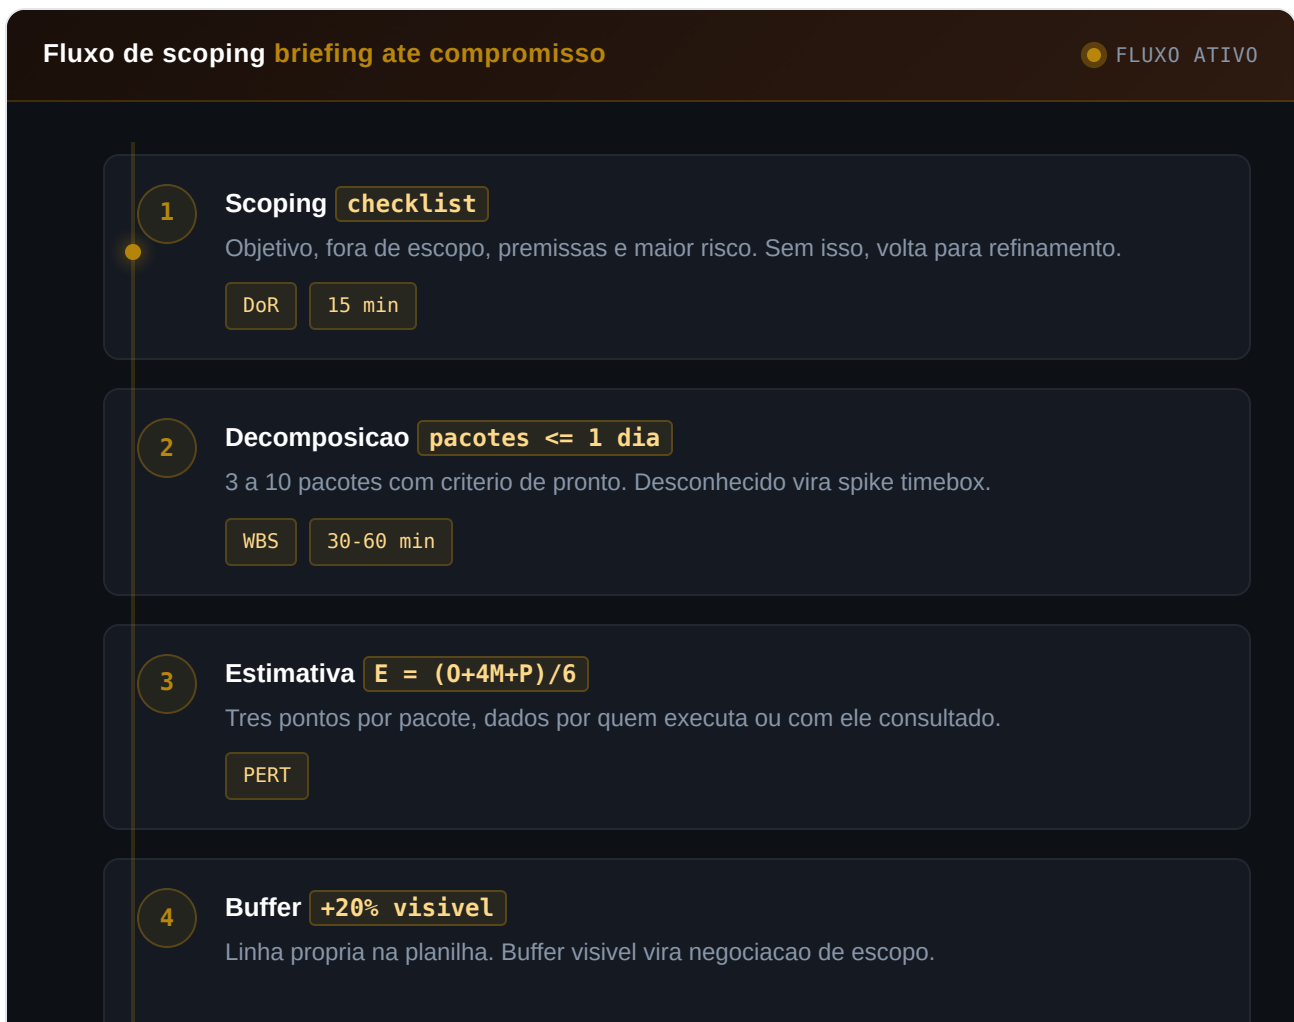

buffer

5

Compromisso

faixa do cone

Conceito 0,25x-4x, requisitos 0,5x-2x, design 0,8x-1,25x. Reestima em 3 marcos.

faixa

3 marcos

Exemplo: relatorio semanal, 6 pacotes, 17h + 3,4h = 4 dias uteis (faixa 2 a 7)   proximas 4 entregas usam o metodo

## 5. Entregas

| ARQUIVO                         | CONTEUDO                                                  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| STANDARD-SCOPING-ESTIMATIVAS.md | Regras de decomposicao, PERT, buffer, cone e anti-padrees |
| planilha-estimativa.md          | Template reutilizavel + exemplo real preenchido           |
| checklist-scoping.md            | Definition of Ready pre estimativa                        |
| DECK-PDI.md                     | Narrativa de 13 slides                                    |
| DEMO-SCRIPT.md                  | Roteiro de demonstracao de 10 min                         |
| ROTEIRO-DOMINIO.md              | 5 perguntas e respostas de dominio                        |

## 6. Metricas de sucesso

| METRICA                       | ATUAL                      | META                 |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------|
| Desvio medio estimado vs real | 60% (6 entregas, ago/2026) | 25% (meta)           |
| Entregas com escopo escrito   | 30%                        | 100% (meta)          |
| Reestimativas por projeto     | 0                          | 3 por projeto (meta) |

**Status:** Atividade desenvolvida e homologação pendente. Metas são projetadas e serão medidas nas próximas 4 entregas com o método aplicado. Referências: curso Agile Project Management no Coursera, vídeo de estimativas Mountain Goat Software no YouTube, Manifesto Ágil e ensaio The New Methodology de Martin Fowler.
