



Fluxo Kanban e Métricas: **lead time, throughput e WIP**

Autor: PDI Marcos Luciano - marcosluciano.rodrigues@v4company.com

Unidade: FV Marketing / V4 Company, Automação e Infraestrutura

Módulo: 07 - Gestão de Projetos Técnicos, Atividade 2

Data: Setembro 2026

Status: **NÃO PUBLICADO** - Desenvolvido / Homologação pendente

Versão: 1.0

pdi-gestao-projetos-tecnicos-a2

1. Contexto

O trabalho da área entrava por **Slack, reunião e e-mail**, sem quadro único e sem limite de trabalho em andamento. Com 2 pessoas e 9 itens paralelos, ninguém sabia dizer o que entrega nesta semana.

A priorização era por gritaria: quem pedia mais alto passava na frente, e o trabalho importante mas silencioso apodrecia na fila.

2. Diagnóstico

Linha de base (ago/2026): **lead time médio de 11 dias úteis**, throughput de 1,5 entrega por semana e WIP médio de 9 itens. O gargalo real estava em Revisão: validação com a operação sem prazo travava cartões por até 18 dias.

- Sem WIP limitado, começar é mais fácil que terminar.


- Sem métrica, discussão de prazo e opinião contra opinião.
- Revisão sem SLA vira cemitério de cartão pronto.

3. Solução

Kanban com 4 colunas e **WIP limitado** (Fazendo 2 por pessoa, Revisão max 3), **classes de serviço** (padrão, urgente, data fixa) e **3 métricas** medidas toda sexta: lead time, throughput e WIP.

- STANDARD-KANBAN-METRICAS.md: colunas, WIP, definições, rotina semanal.
- politicas-kanban.md: regras operacionais coladas no quadro.
- template-metrica-semanal.md: registro semanal + exemplo da semana 01.

4. Como funciona

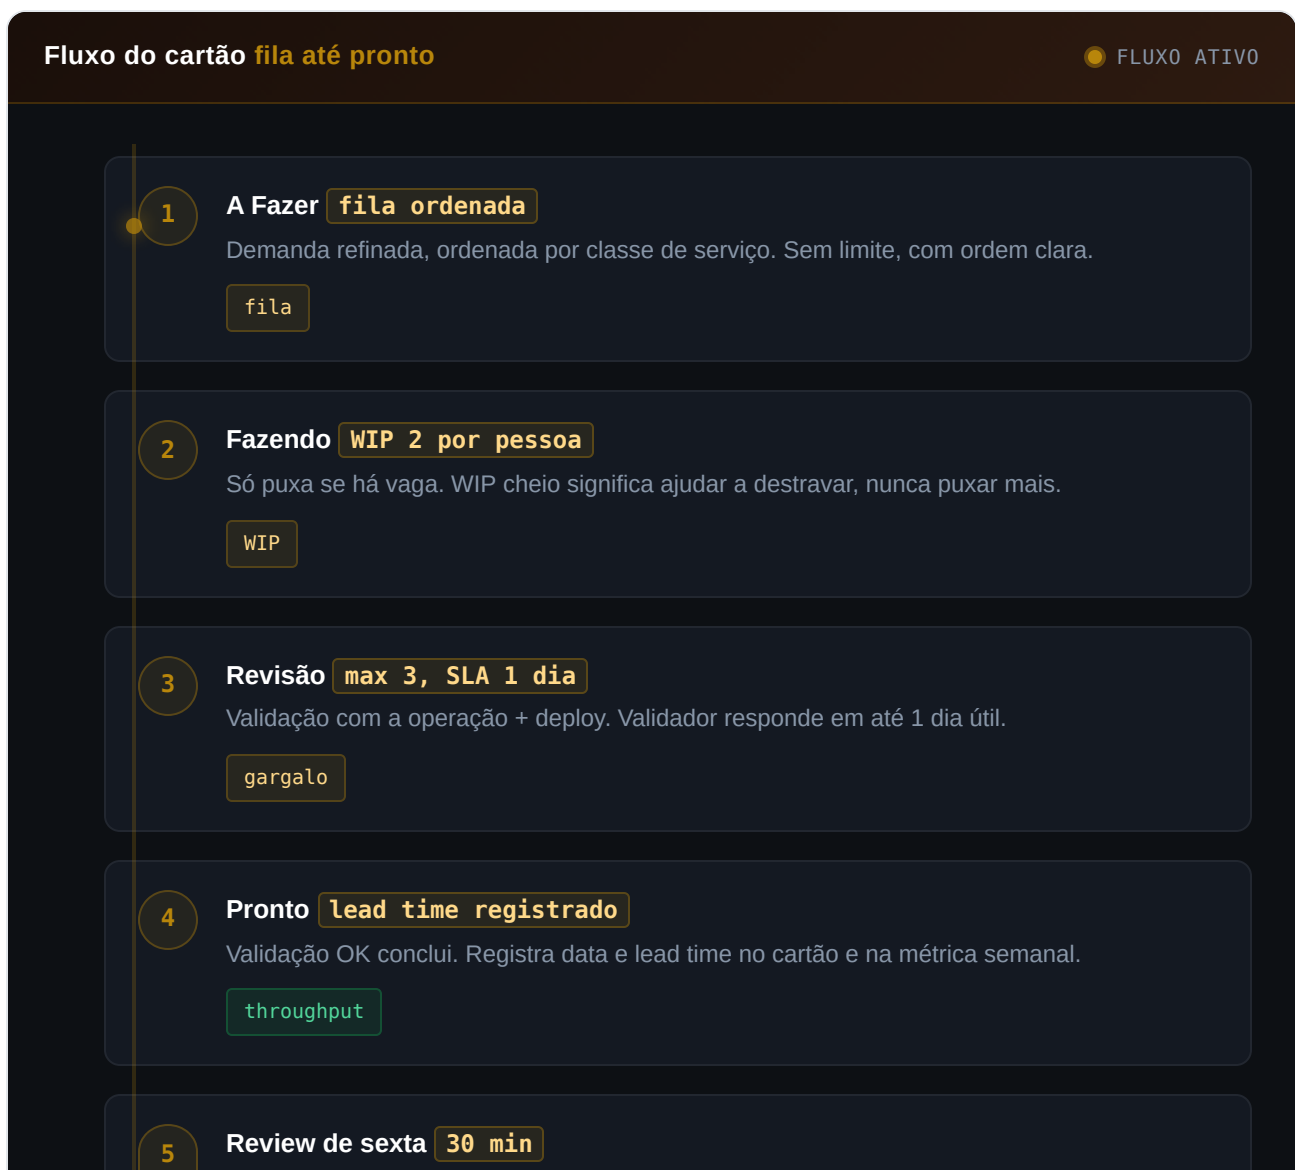

Registra as 3 métricas, ataca o cartão mais antigo e decide 1 ajuste.

melhoria

Lei de Little: $WIP = \text{throughput} \times \text{lead time}$

meta em 4 semanas: 5 dias, 3/semana, WIP 4

5. Entregas

ARQUIVO	CONTEÚDO
STANDARD-KANBAN-METRICAS.md	Colunas, limites, métricas, rotina e anti-padroes
politicas-kanban.md	Regras operacionais do quadro
template-metrica-semanal.md	Registro semanal + linha de base
DECK-PDI.md	Narrativa de 13 slides
DEMO-SCRIPT.md	Roteiro de demonstração de 10 min
ROTEIRO-DOMINIO.md	5 perguntas e respostas de domínio

6. Métricas de sucesso

MÉTRICA	ATUAL	META
Lead time médio	11 dias úteis (ago/2026)	5 dias úteis (meta)
Throughput semanal	1,5 entrega/semana	3 entregas/semana (meta)
WIP médio	9 itens abertos	4 itens abertos (meta)

Status: Atividade desenvolvida e homologação pendente. Metas projetadas para 4 semanas de operação do quadro. Referências: curso Kanban essencial (DIO), vídeo sobre CFD (YouTube), Kanban quickstart e CFD no Microsoft Learn.
