



PDI 2026: GESTAO DE PROJETOS TECNICOS

Fluxo Kanban e Metricas: **lead time, throughput e WIP**

Autor: PDI Marcos Luciano - marcosluciano.rodrigues@v4company.com

Unidade: FV Marketing / V4 Company, Automacao e Infraestrutura

Modulo: 07 - Gestao de Projetos Tecnicos, Atividade 2

Data: Setembro 2026

Status: **NAO PUBLICADO** - Desenvolvido / Homologacao pendente

Versao: 1.0

pdi-gestao-projetos-tecnicos-a2

1. Contexto

O trabalho da area entrava por **Slack, reuniao e e-mail**, sem quadro unico e sem limite de trabalho em andamento. Com 2 pessoas e 9 itens paralelos, ninguem sabia dizer o que entrega nesta semana.

A priorizacao era por gritaria: quem pedia mais alto passava na frente, e o trabalho importante mas silencioso apodrecia na fila.

2. Diagnostico

Linha de base (ago/2026): **lead time medio de 11 dias uteis**, throughput de 1,5 entrega por semana e WIP medio de 9 itens. O gargalo real estava em Revisao: validacao com a operacao sem prazo travava cartoes por ate 18 dias.

- Sem WIP limitado, começar é mais fácil que terminar.


- Sem metrica, discussao de prazo e opiniao contra opiniao.
- Revisao sem SLA vira cemiterio de cartao pronto.

3. Solucao

Kanban com 4 colunas e **WIP limitado** (Fazendo 2 por pessoa, Revisao max 3), **classes de servico** (padrao, urgente, data fixa) e **3 metricas** medidas toda sexta: lead time, throughput e WIP.

- STANDARD-KANBAN-METRICAS.md: colunas, WIP, definicoes, rotina semanal.
- politicas-kanban.md: regras operacionais coladas no quadro.
- template-metrica-semanal.md: registro semanal + exemplo da semana 01.

4. Como funciona

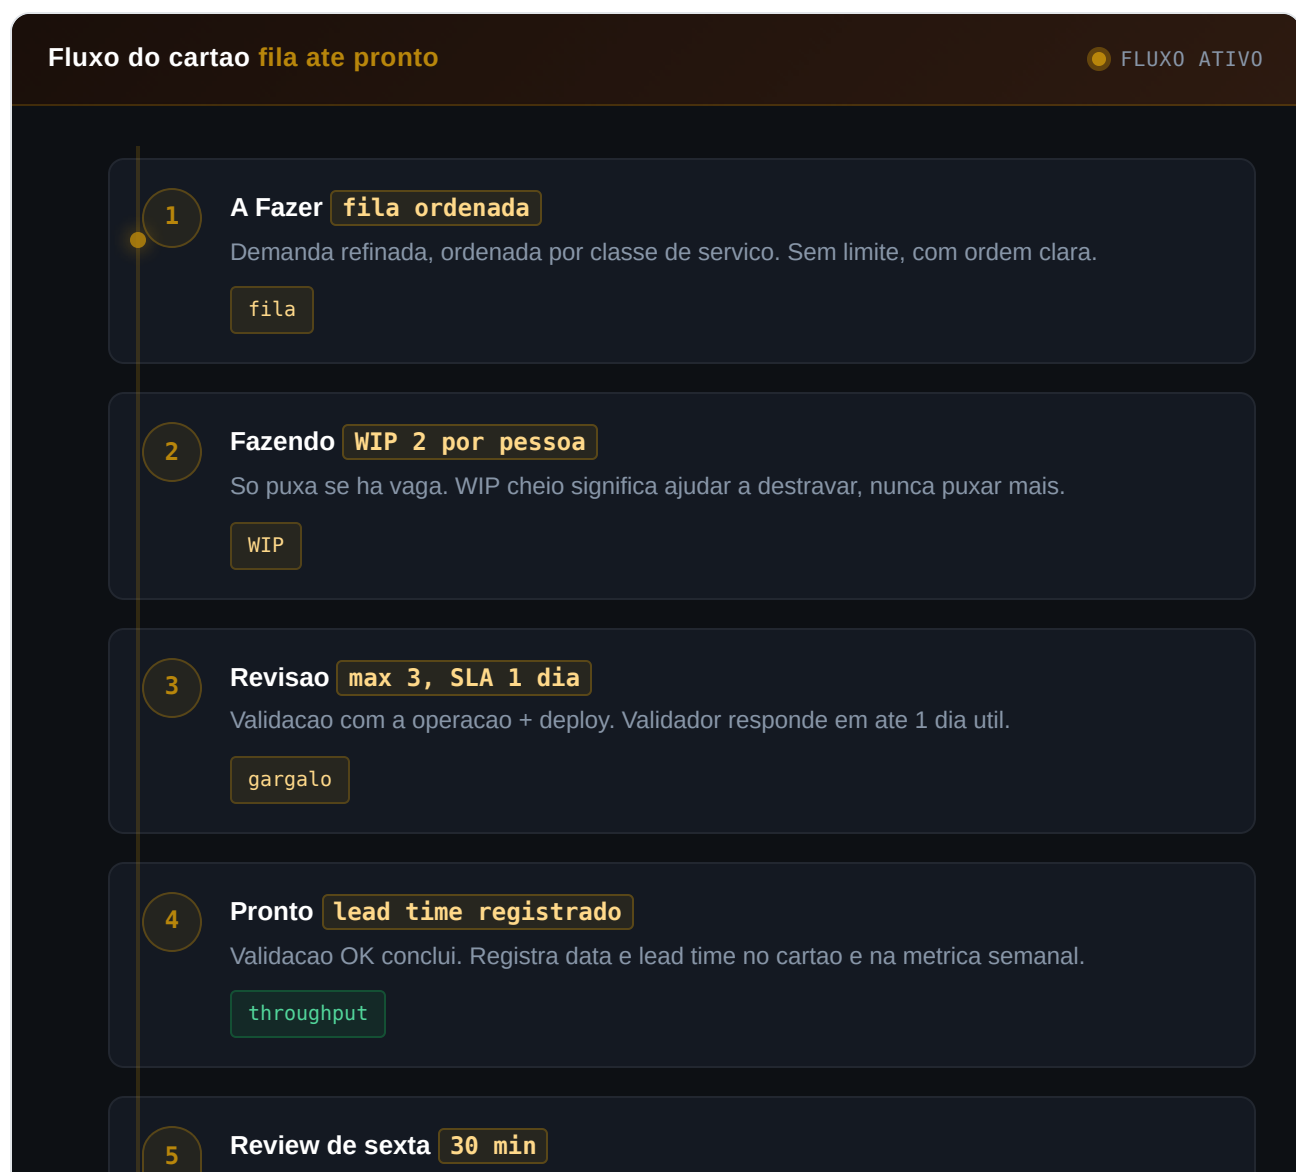

Registra as 3 metricas, ataca o cartao mais antigo e decide 1 ajuste.

melhoria

Lei de Little: $WIP = throughput \times lead\ time$

meta em 4 semanas: 5 dias, 3/semana, WIP 4

5. Entregas

ARQUIVO	CONTEUDO
STANDARD-KANBAN-METRICAS.md	Colunas, limites, metricas, rotina e anti-padroes
politicasskanban.md	Regras operacionais do quadro
template-metrica-semanal.md	Registro semanal + linha de base
DECK-PDI.md	Narrativa de 13 slides
DEMO-SCRIPT.md	Roteiro de demonstracao de 10 min
ROTEIRO-DOMINIO.md	5 perguntas e respostas de dominio

6. Metricas de sucesso

METRICA	ATUAL	META
Lead time medio	11 dias uteis (ago/2026)	5 dias uteis (meta)
Throughput semanal	1,5 entrega/semana	3 entregas/semana (meta)
WIP medio	9 itens abertos	4 itens abertos (meta)

Status: Atividade desenvolvida e homologacao pendente. Metas projetadas para 4 semanas de operacao do quadro. Referencias: curso Kanban essencial (DIO), video sobre CFD (YouTube), Kanban quickstart e CFD no Microsoft Learn.
